

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 31年 3月12日

計画の名称	1 篠原地区における安全・安心・快適な生活空間の創出												
計画の期間	平成25年度 ～ 平成29年度 (5年間)						交付対象	南国市					
計画の目標													
南国市都市計画マスタープランにおいて、「利便性の高い交通ネットワークづくり」、「高齢者にやさしい安全で安心な生活環境づくり」、「快適で良好な居住環境づくり」等が都市づくりの基本方針として整理されている。 本地区においては、県施行である都市計画道路整備と併せて、一体的な面整備事業を実施し、土地利用上の課題(未接道地、避難経路の解消)を解決し、安全・安心で快適な居住環境づくりをめざす。													
計画の成果目標(定量的指標)													
・幅員6m以上の道路に接していない未接道地と避難経路の解消を図る。													
定量的指標の定義及び算定式										定量的指標の現況値及び目標値			備考
										当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H29末)	
地区内に占める道路幅6m以上の割合 地区内に占める道路幅6m以上の割合 = 地区内整備済み道路延長 / 幅員6m以上の計画道路延長										0%	0%	20%	
全体事業費	合計 (A+B+C)	576 百万円	A	576 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)			0.0 %	

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制		事後評価の実施時期	
-		平成31年3月	
		公表の方法	
		南国市ホームページ	

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H25	H26	H27	H28	H29		
1-A-1	都再区画	一般	南国市	直接	南国市	篠原土地区画整理事業	都市再生区画整理事業 A=5.1ha	南国市						576	
合計														576	

B 関連社会資本整備事業


番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H25	H26	H27	H28	H29		
														0	
合計														0	

番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考

(参考図面) 市街地整備

平成 31年 3月12日

計画の名称	1 篠原地区における安全・安心・快適な生活空間の創出		
計画の期間	平成25年度 ～ 平成29年度 (5年間)	交付対象	南国市

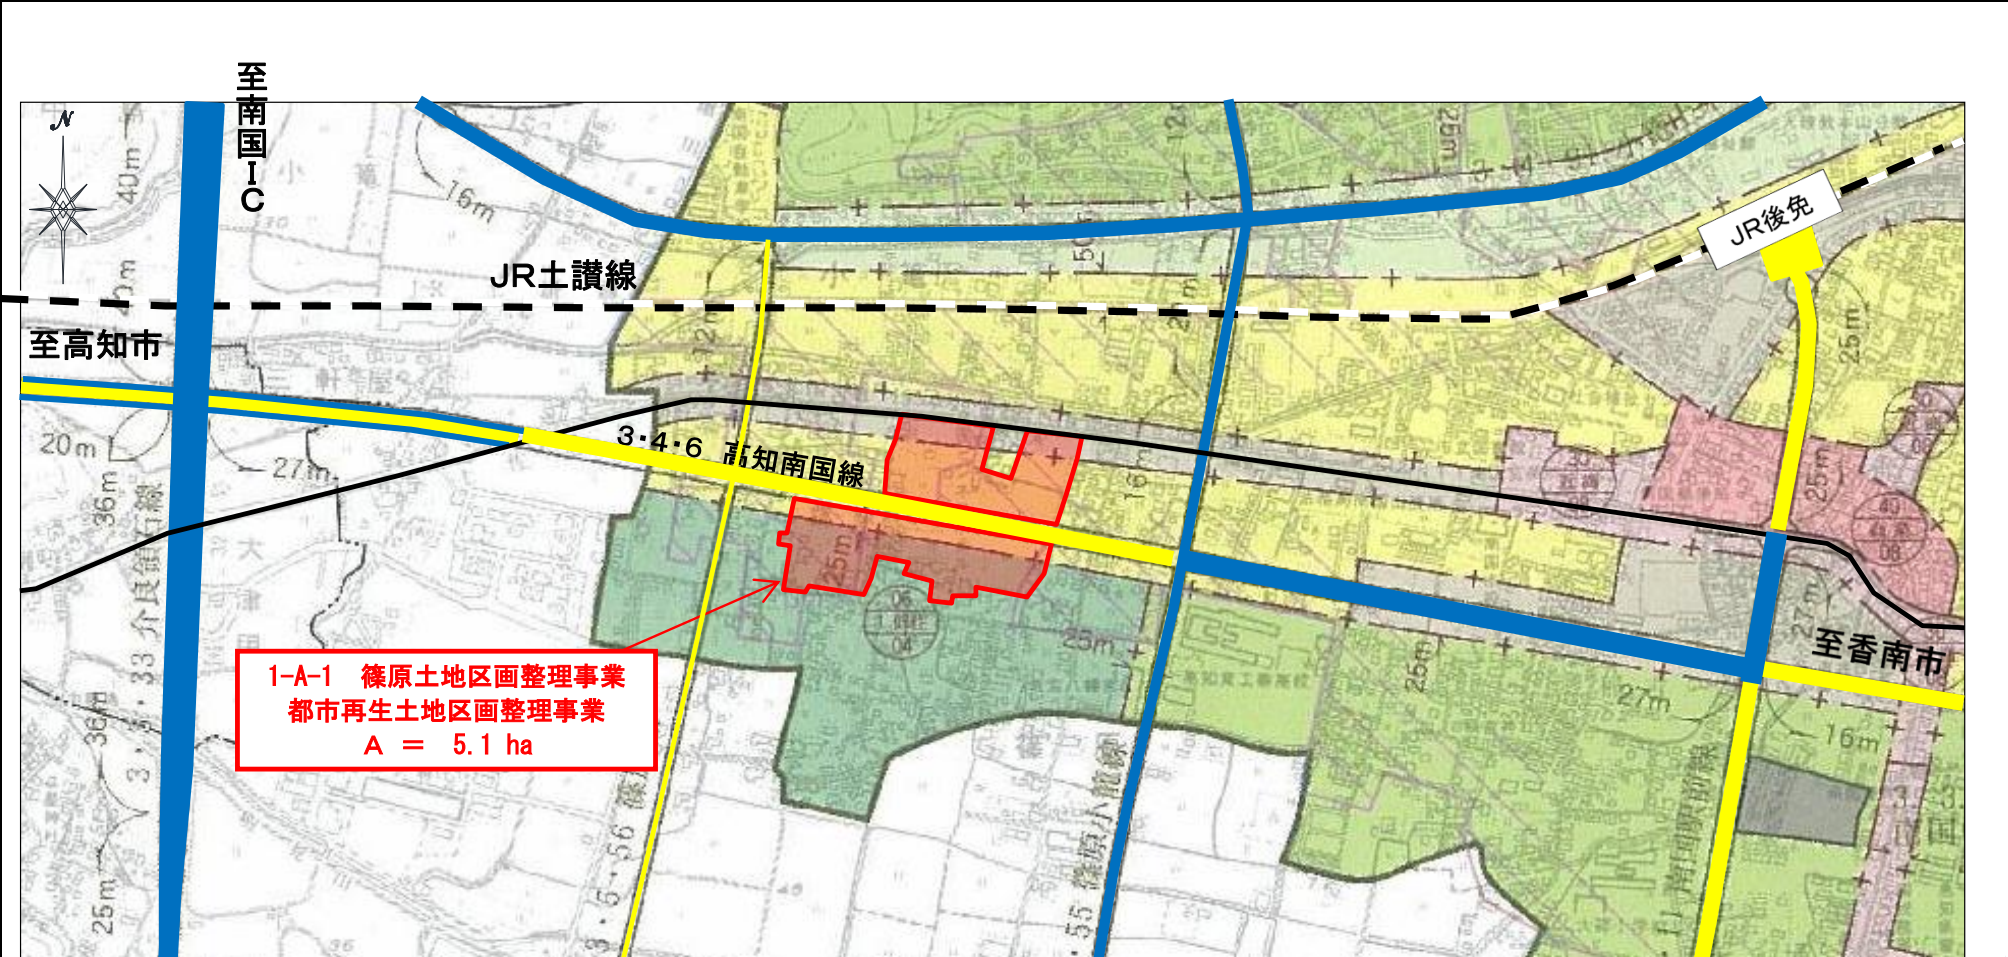

凡 例		事業区域		都市計画道路	
			都市再生区画整理事業		整備済み
					未完成(既存道路供用中)
					未整備
